

1. Generel information

Kære kunde

Det glæder os, at du har valgt netop vores bjælkehus.

Læs venligst dette dokument grundigt igennem, før du påbegynder montagen af bjælkehuset. Dette vil sikre, at du undgår problemer.

Anbefalinger:

- Behold bjælkehuset indpakket indtil endelig montering. Skal pakken ligge ude i en længere periode, anbefales en pressening til forlængelse af liggeperioden.
- Når du vælger placeringen til dit bjælkehus, skal du sikre dig, at det ikke vil blive udsat for ekstreme vejrforhold (områder med kraftig snefald eller vind).

Har du efter læsning af dette dokument spørgsmål eller brug for vejledning, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 75 66 28 75.

På www.redskabshus.dk kan du trin for trin se byggeprocessen for et bjælkehus. Fremgangsmåden for det viste hus er den samme for alle vores bjælkehuse.

Maling og vedligeholdelse

Træ er et naturmateriale, der varierer i struktur og form afhængigt af vækstforhold. Store og små revner, farveforskelle og vridninger samt en skiftende struktur af træ er ikke fejl, men et resultat af, at træ er et naturmateriale.

Ubeskyttet træ (undtagen fundamentbjælker) bliver grålige efter at have lagt uberørt et stykke tid. De kan blive mørke og mugne. For at beskytte trædelene til dit bjælkehus skal de straks behandles med et træbeskyttelsesmiddel.

Vi anbefaler, at du straks efter montering behandler dit bjælkehus med en god grundingsolie og herefter med en oliebaseret træbeskyttelse eller maling. Kun dette vil forhindre fugtindtrængning i træværket. Læs mere her: www.solundhuse.dk/vedligehold-dit-traehus/

Når der males: Brug kvalitetsværktøj og maling. Følg anvisningen fra producentens sikkerheds- og brugsanvisninger for malingen og mal aldrig en overflade i stærkt sollys eller i regnvejr. Køber du ikke træbeskyttelse hos Sølund, anbefaler vi at kontakte en specialist om hvilken maling, der er egnet til ubehandlet nåletræ.

Korrekt behandling af træværket vil forlænge dit bjælkehus' levetid betydeligt. Vi anbefaler, at du inspicerer bjælkehuset grundigt en gang hvert halve år.

2. Forberedelse før montage

Værktøj og hjælpemidler

Til montering af bjælkehuset skal du bruge følgende værktøj:

- Montagesæt
- Stige
- Hammer
- Vaterpas
- Skruetrækker
- Sav
- Kniv
- Målebånd
- Tang
- Skruemaskine

RÅD: For at undgå splinter anbefaler vi, at du bruger beskyttelseshandsker under montagen.

Forberedelse af montage:

Sorter delene ifølge vægtegningerne i manualen og placer dem på de fire sider af huset i rækkefølgen for montage (fig. 1).

BEMÆRK: Anbring aldrig delene direkte på græs eller på et mudret underlag, da det vil være meget vanskeligt eller endog umuligt at rense dem senere.

Fundament

Et godt fundament er det vigtigste for at garantere varigheden og sikkerheden af dit hus. Kun et helt plan og solidt fundament, vil sikre problemfri montage af huset, dets stabilitet og især tilpasning af dørene. Med et godt fundament vil dit hus stå mange år frem.

Vi anbefaler følgende fundamentmuligheder:

- Punktfundament
- Fundament af have- eller fortovsfliser
- Fuldstøbt betonfundament

Læs mere om valg af fundament her:

www.solundhuse.dk/valg-af-fundament/

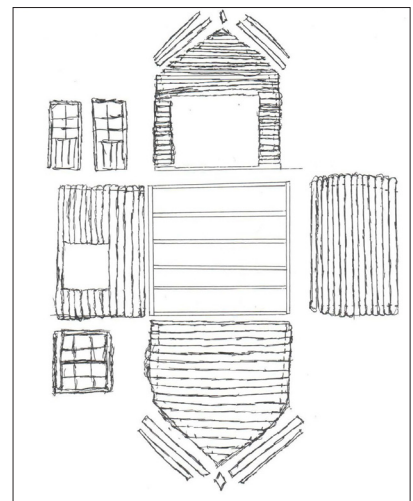


Fig. 1. Klargøring før montage:
Fordel de relevante dele ved hver af husets fire sider.

3. Samling af huset

Generelt om bundrammen (Fundamentbjælker)

Husets bundramme skal være helt flad og plan for at sikre, at monteringen gennemføres uden problemer.

BEMÆRK: Forskellige huse kan have forskellige fundament-placeringer - se vedlagte bundrammetegning.

Placer de imprægnerede bundrammebjælker på det færdige

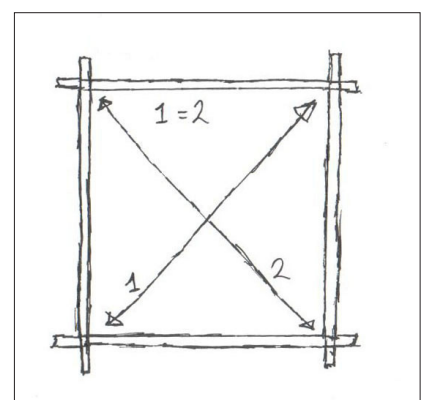


Fig. 2. Diagonalmål: Skal give samme mål på længde 1 og 2.

S Ø L U N D

fundament i overensstemmelse med tegningen med lige store intervaller. Sørg for, at bjælkerne er plane, før de bliver skruet sammen.

OBS: Kontroller diagonalmålene og juster sokkelrammen om nødvendigt. Kun hvis de diagonale mål er fuldstændigt ens, kan du fortsætte montagen (fig. 2).

RÅD: For at sikre beskyttelse mod vind og storm, anbefales det at fastgøre bundrammebjælkerne til det støbte fundament. Til dette kan du bruge for eksempel vinkelbeslag, karmskruer eller andet. Dette er ikke inkluderet i pakken.

Vi anbefaler også at lægge murerpap/vindpap eller lignende mellem fundament og bundrammen for at undgå, at fugt trænger op nedefra (ikke inkluderet).

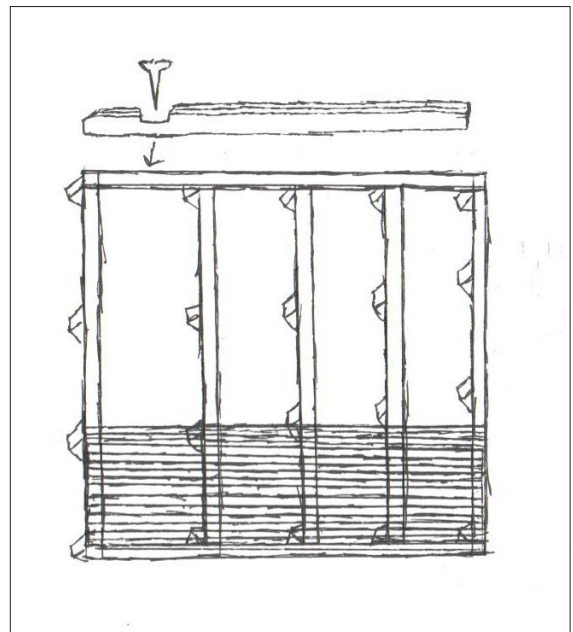


Fig. 3. Illustration af bundrammebjælkerne og montage af gulvbrædder. Første række af væg-bjælker skrues fast til bundrammen.

Generelt om vægge

Når du installerer væggene, er det vigtigt at huske:

- Vægbjælkerne samles altid med deres tunge/fer opad
- Hvis det er nødvendigt, skal du bruge gummihammer (og evt. en slåklods til at slå på). Slå aldrig direkte på fer med hammeren.

Monter væggene i overensstemmelse med de vedlagte vægplaner.

1. Monter de halvskårne vægbrædder og fastgør dem med skruer til bundrammebjælkerne.
2. Monter derefter sidevægs-brædderne. Sørg for, at det første lag af brædder ligger en smule ud over de imprægnerede bundrammebjælker (3-5 mm). Du vil således beskytte huset mod fugt, så der skabes frit løb af regnvand ned til jorden.

Fortsæt montage af væggene ved kraftigt at tvinge vægbjælkerne ned i hinanden. Om nødvendigt brug slåblokken til at hamre på. Glem ikke at starte montagen af døren og vinduerne løbende med resten af montagen. Montage af dør påbegyndes ofte efter 5.-6. lag af bjælker eller som manualen foreskriver (fig. 4).

Generelt om døre og vinduer

Dørramme

- Leveres dørrammen i separate dele, skal du selv samle den:
 - For at gøre dette, skal du samle de fire dele af rammen og skrue dem sammen.
 - Sørg for, at den del af rammen med den dybeste udskæring installeres opad. Sidekarmene kendetegnes ved, at de har hængsler.

S Ø L U N D

- Det anbefales, at du monterer selve døren til sidst, medmindre manualen foreskriver noget andet.
- Leveres dørrammen samlet, skal den blot monteres på væg bjælkerne.

Dørinstallation

Dørrammen placeres i den formede åbning og presses med kraft på det nedre bræt (fig. 4).

Hvis det er en dobbeltdør, placeres døren på hængslerne nu.

For at åbne og lukke døren; påsæt de separat pakgede håndtag og lås.

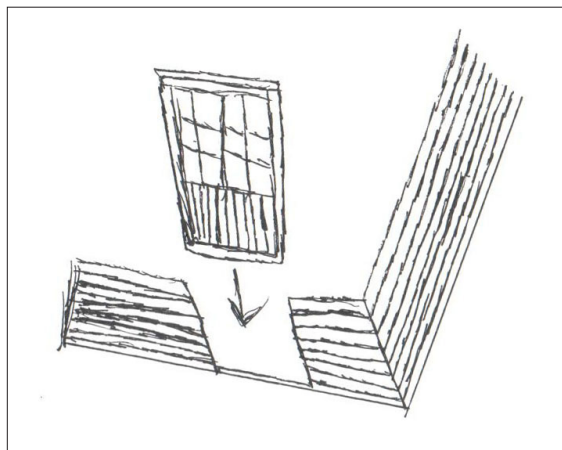


Fig. 4. Montering af dør: Ofte efter 5-6 lag væg bjælker (se manual).

Vinduesinstallation

Forsæt med installationen af vægbrædder, indtil du når vindueshøjde. Vedlagte vægplan (se manual) viser, hvor mange brædder, der skal være under vinduet. Installer vinduet på samme måde som døren. Ligesom ved døren skal du her presse vinduesrammen sammen med vinduet ned på det nedre bræt i den formede åbning. Sørg for, at vinduet vender rigtigt.

Bemærk: Døre og vinduer må ikke fastgøres på vægbrædderne, da træværket skal have plads til at arbejde efter vind og vejr.

Finjustering ved døre og vinduer i 2-3 uger efter huset er samlet, kan være nødvendigt, da huset derefter vil have tilpasset sig vejrforholdene, og brædderne er faldet på plads.

Læs om justering af døre og hængsler her:

www.solundhuse.dk/justering-af-doere-og-haengsler/

Generelt om tag

Før du installerer taget, skal du sikre dig, at huset er helt plan. Brug et vaterpas til at kontrollere alle væggene.

Bemærk: Brug en stabil stige eller stillads ved montage af taget. Taget kun er beregnet til at holde et lige tryk (sne, vind osv.) og ikke et direkte tryk på et bestemt punkt.

Begynd monteringen af tagbrædderne fra forkanten af huset. Tryk brædderne forsigtigt sammen og sæt dem sammen foroven med søm eller skruer. De fastsømmes til spærrerne og de øverste vægbrædder.

- Under hele processen med montering af tagbrædderne er det vigtigt, at du sikrer, at brædderne er på det samme højdepunkt på spærrerne i begge sider. Sørg også for, at tagskægget/udhænget har den samme ensartede afstand.

S Ø L U N D

- Tagbrædderne skal være lig med spærrernes ender både foran og bagtil. Hvis det er nødvendigt, saves brædderne til, så de passer i bredden og går til enderne på spærrerne.

Følger der shingles tagpap med til dit hus, kan du læse og se video om, hvordan du monterer disse her: www.solundhuse.dk/shingles-tagpap/

Generelt om gulv

Når huset er helt færdigbygget, kan du montere gulvbrædderne for at undgå unødigt snavs og skidt på brædderne. Enkelte brædder skal muligvis tilpasses.

BEMÆRK: Afhængigt af klimaet og husets placering kan gulvbrædderne enten svulme op eller mindskes. Sørg evt. for ved samling af brædderne at have et mellemrum (1 mm.) for at give plads til, at brædderne kan udvide sig. Hvis brædderne er fugtige, kan du sammensætte brædderne helt tæt, da der, når de senere bliver tørre, kan forekomme mellemrum.

Generelt om stormlister

Hvis stormlister er inkluderet i huspakken: Monter stormlisterne på indersiderne af husets gavle. Stormlisterne fastgøres med de medfølgende bolte. Huller til bolte bores med passende træbor. Hold afstanden som vist på tegningen, så der ikke opstår problemer, hvis/ når træet hæver eller trækker sig sammen.

Hvis nødvendigt, forkort den øvre ende af stormlisten. Stram ikke skruerne for voldsomt, da træet skal have mulighed for at øges eller mindskes. Når huset har sat sig, skal du evt. tilpasse stormlisterne.

Generelle råd

Problem: Revner/huller opstår mellem vægbrædderne

Årsag: Der kan være eftermonteret dele til huset, som ikke tillader træet at vokse/mindskes.

Løsninger:

- Afmonter disse dele.
- Hvis døren/vinduet er fastgjort til vægbjælkerne med skruer/søm, fjernes disse skruer/søm.
- Hvis stormbjælkerne er skruet for stramt, løsnes møtrikker.
- Hvis nedløbsrør er installeret på væggen, løsne disse.

Problem: Døre og vinduer sidder fast

Årsag: Huset/fundamentet har sat sig.

Løsning: Kontroller, om huset er i vater. Understøt bundramme, bjælker og vægge.


Årsag: Døre og vinduer er svulmet op på grund af fugt.

Løsning: Juster døren og vinduets hængsler. Hvis det er nødvendigt; fil døren eller vinduet.


Skulle der mod forventning opstå fejl eller mangler, kontakt da venligst straks Sølund Huse.

Vi ønsker dig alt succes med montagen af dit bjælkehus og meget glæde af huset fremover.


Alma 2



595 x 887 cm



575 x 867 cm




70 mm




595

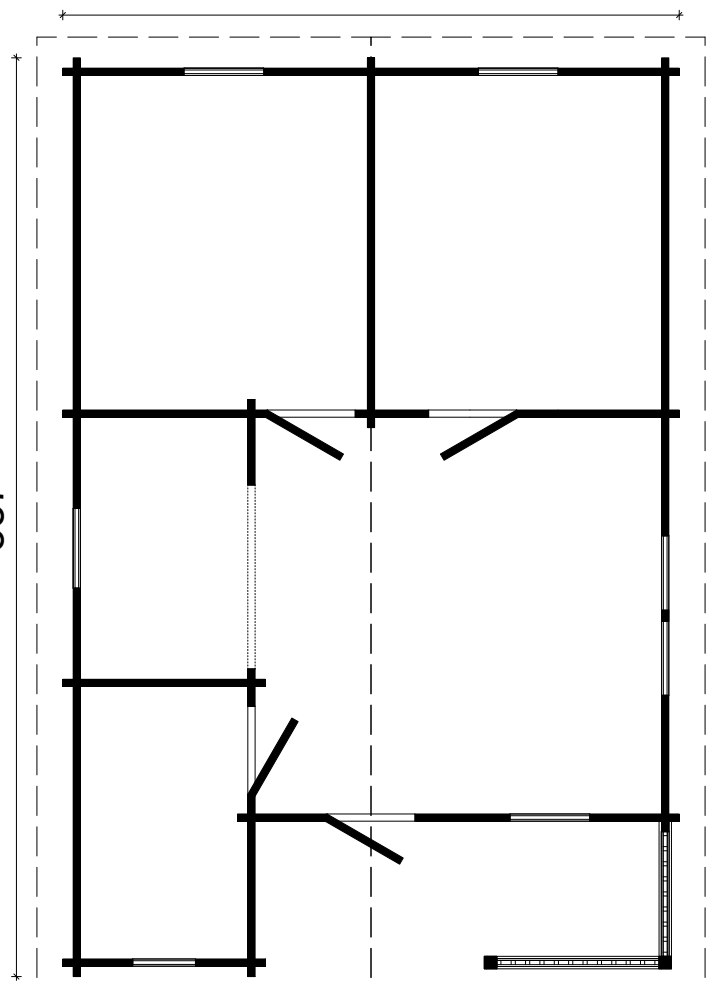887





DE
EN
NL
NO
ES
PT
PL
EE
IT
DK
SE
FR


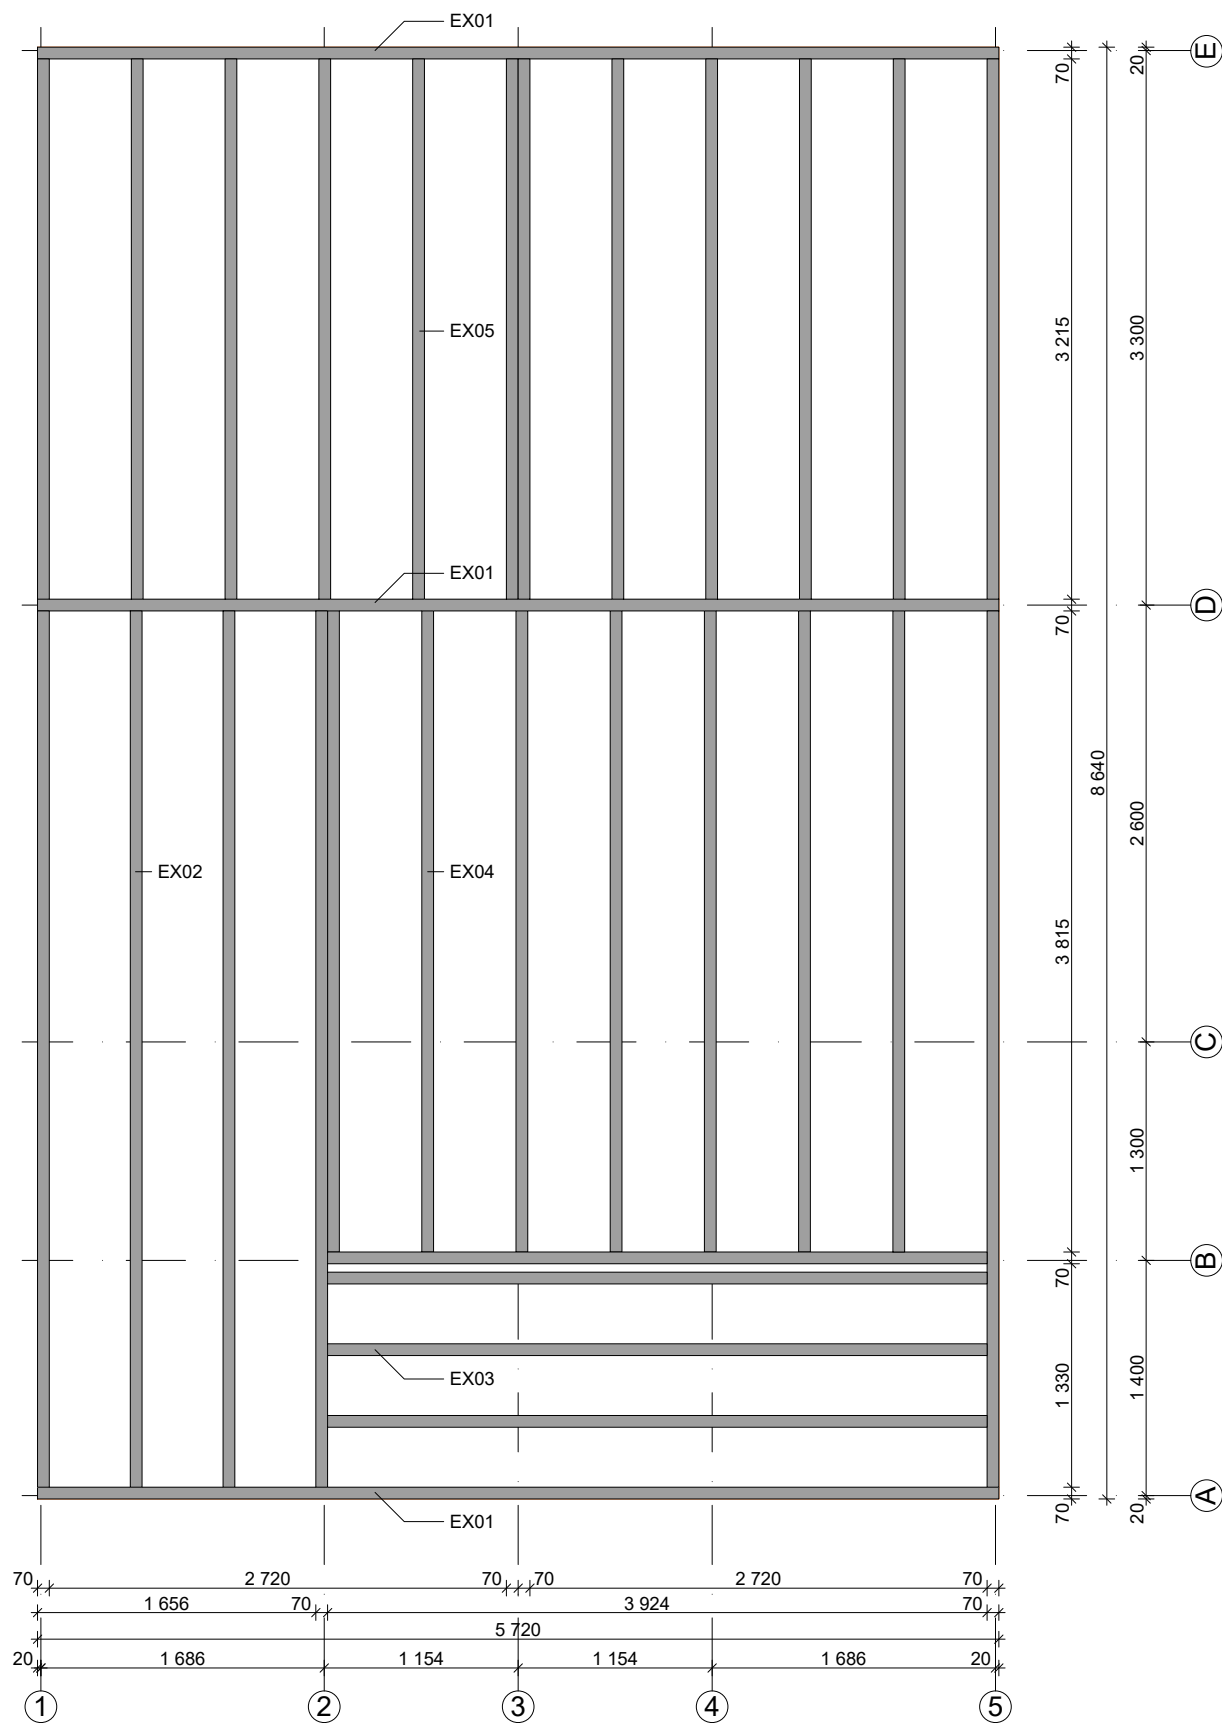
Alle angegebenen Maße sind ca.-Maße
All dimensions are approximate
Alle maten zijn circa maten
Alle vedlagte mål er ca
Todas las dimensiones son aproximadas
Todas as dimensões são aproximadas
Wszystkie wymiary są przybliżone
Kõik mõõdud on ligilähedased
Tutte le misure indicate sono circa
Alle angivne mål er ca.-mål
Samtliga mått är ungefärliga
Toutes les dimensions fournies sont approximatives



Alma 2 / 595 x 887 cm

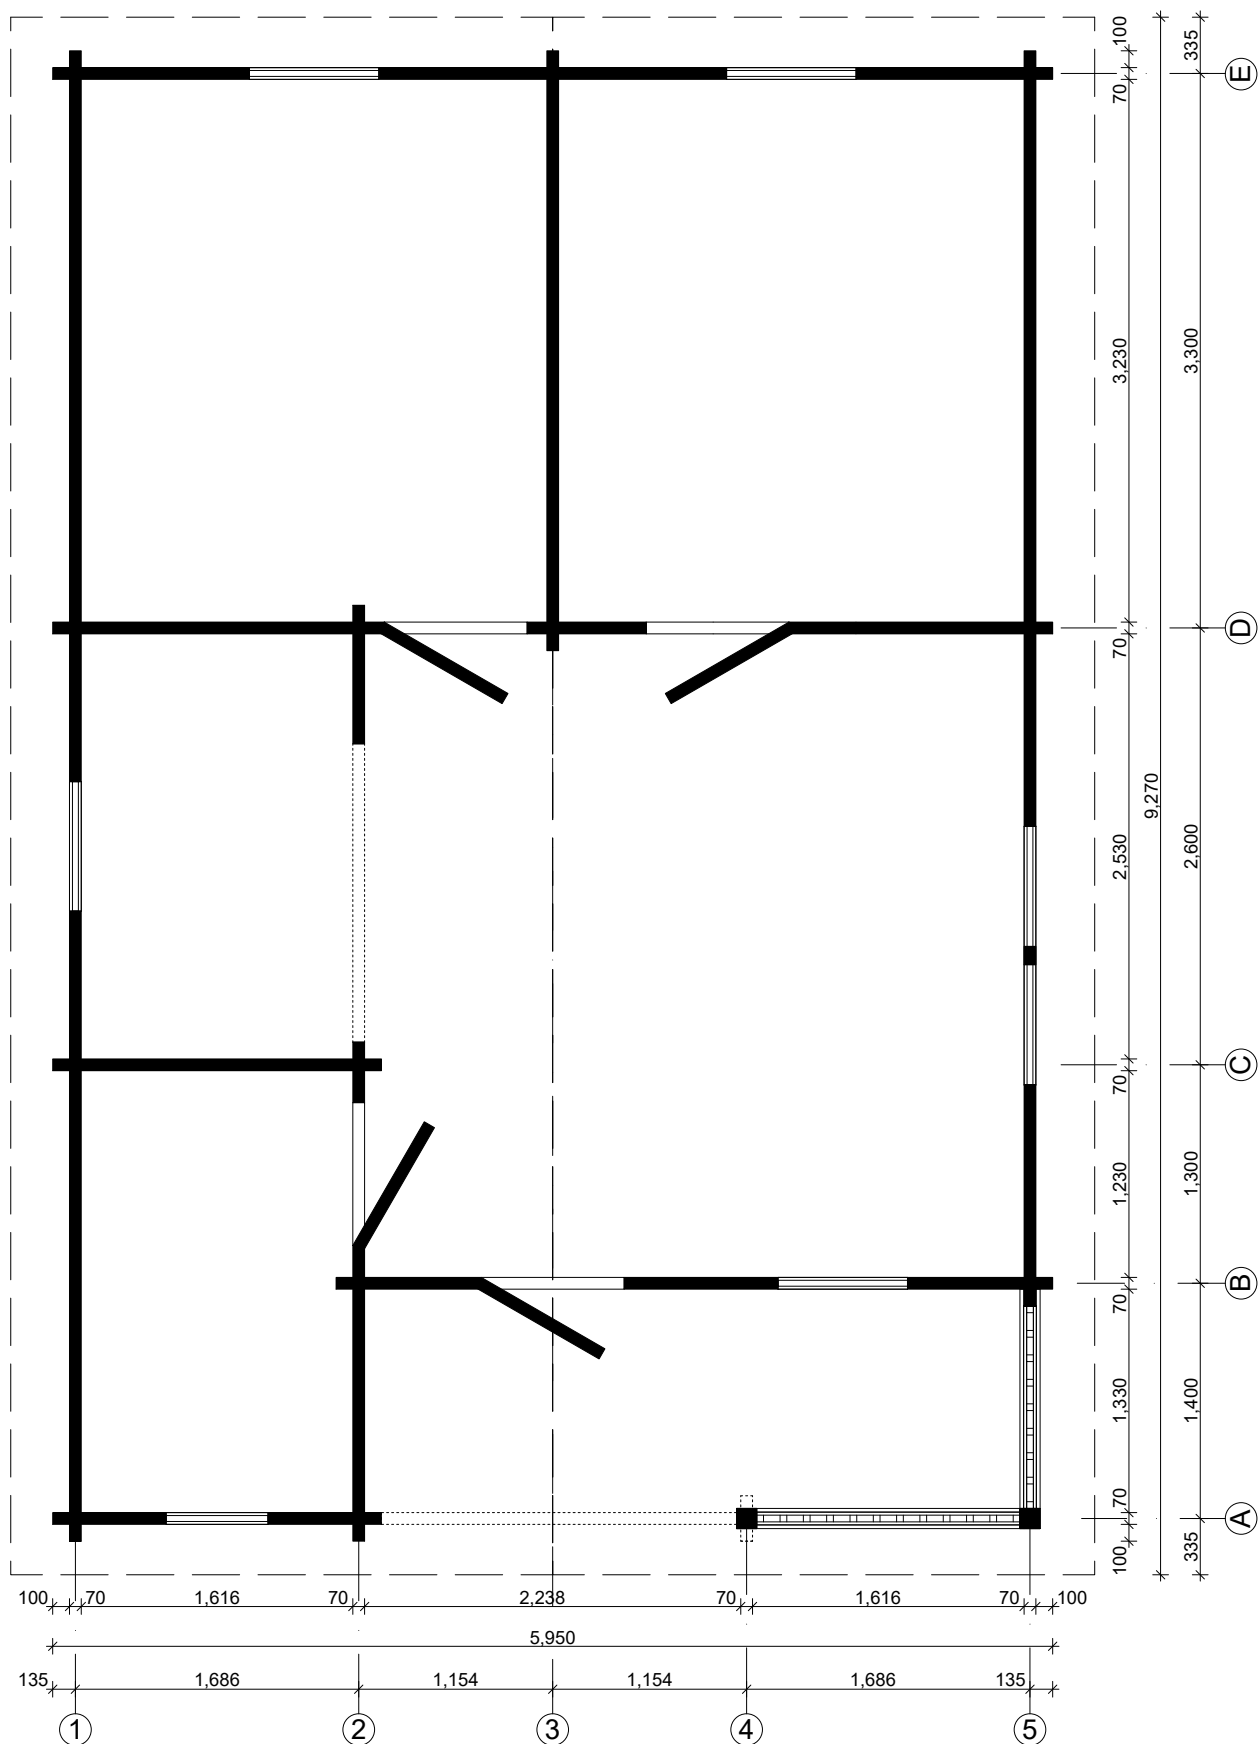

Alma 2 / 595 x 887 cm

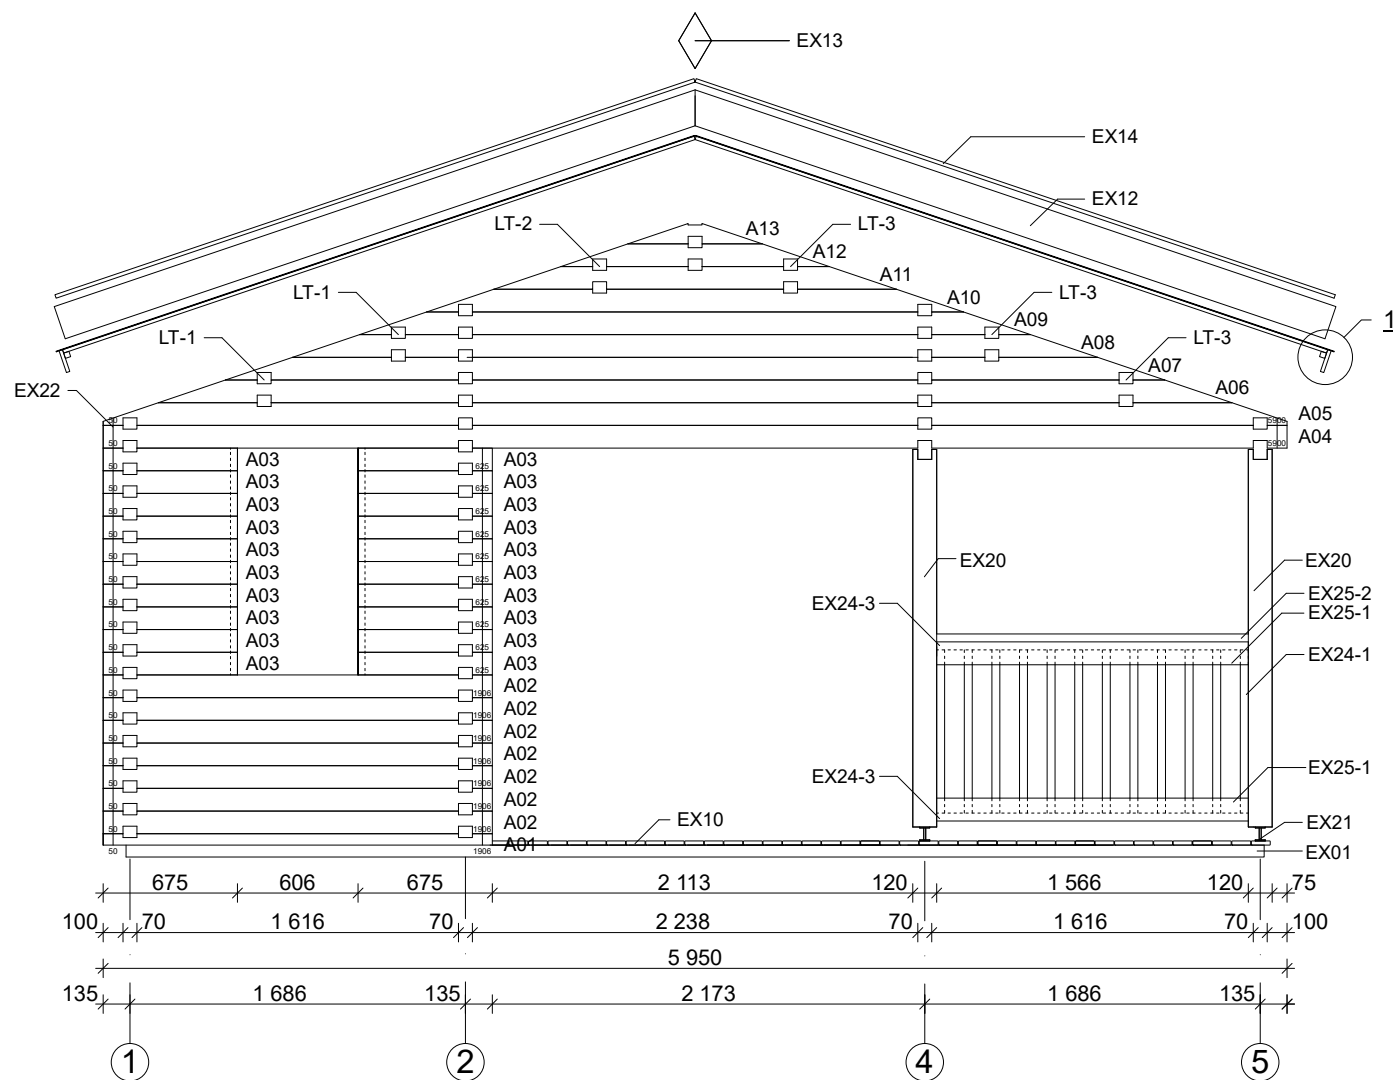


The drawing consists of two elevation views of a building facade, labeled C and B.

Elevation C (Left): This view shows a gabled roof with three dormers labeled LT-1, LT-2, and LT-3. The facade is composed of a series of horizontal lines representing windows, labeled C01 through C08. The dimensions are as follows:



- Overall height: 1 956
- Overall width: 1 686
- Height of the main facade: 1 616
- Height of the dormers: 70
- Width of the dormers: 135

Elevation B (Right): This view shows a gabled roof with four dormers labeled LT-2, LT-3, LT-3, and LT-3. The facade is composed of a series of horizontal lines representing windows, labeled B01 through B06. The dimensions are as follows:

- Overall height: 4 264
- Overall width: 3 994
- Height of the main facade: 3 924
- Height of the dormers: 70
- Width of the dormers: 135




Alma 2 / 595 x 887 cm

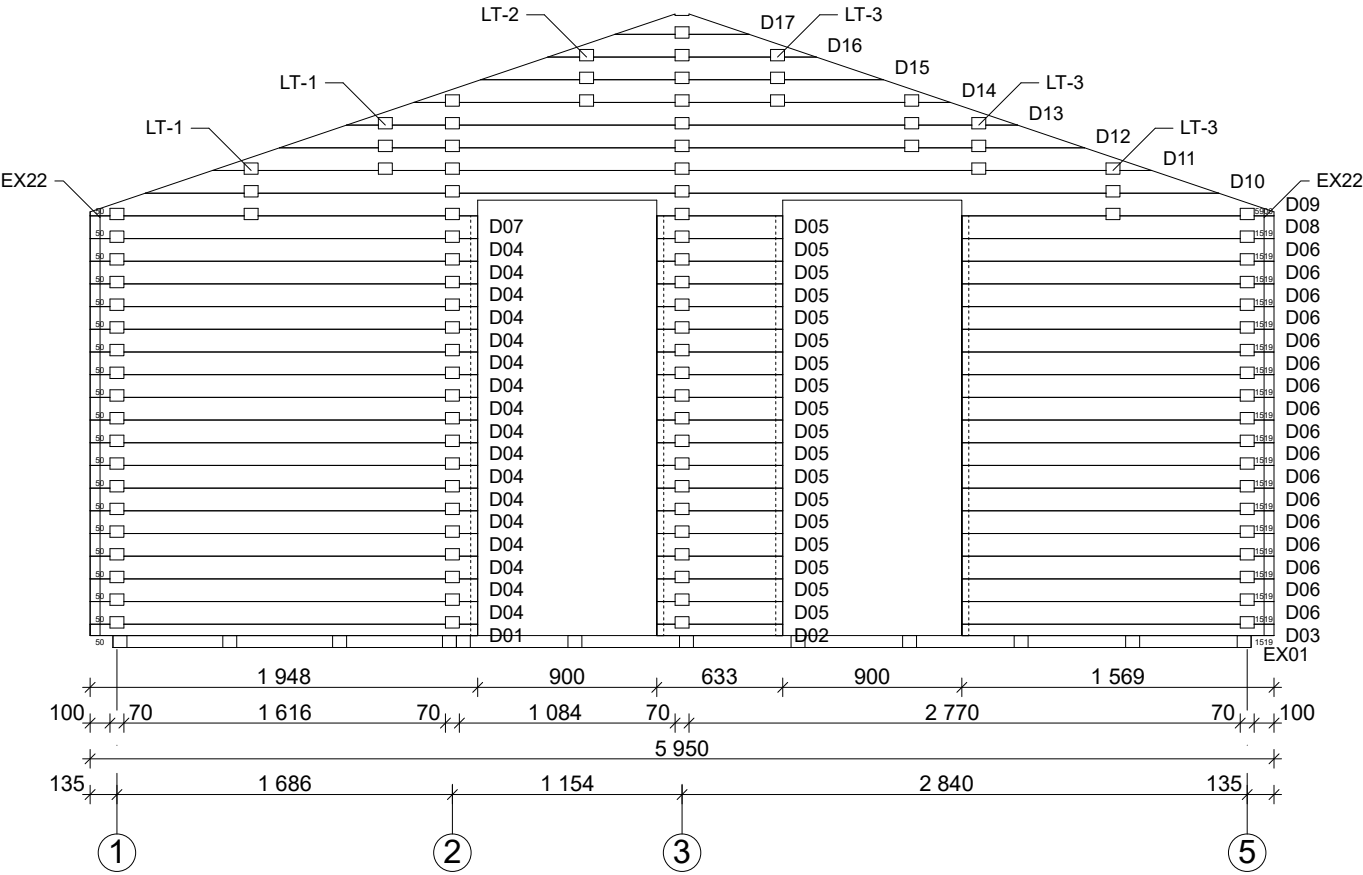



Architectural drawing of a building facade showing a gabled roof with skylights (LT-1, LT-2, LT-3), windows (E01-E05, E07-E13), and doors (EX05, EX22). The drawing includes a section line A-A and a dimension table below.



Dimension	Value
1	1 170
2	770
3	2 070
4	770
5	1 170
6	70
7	2 770
8	5 950
9	2 840
10	2 840
11	135




Alma 2 / 595 x 887 cm

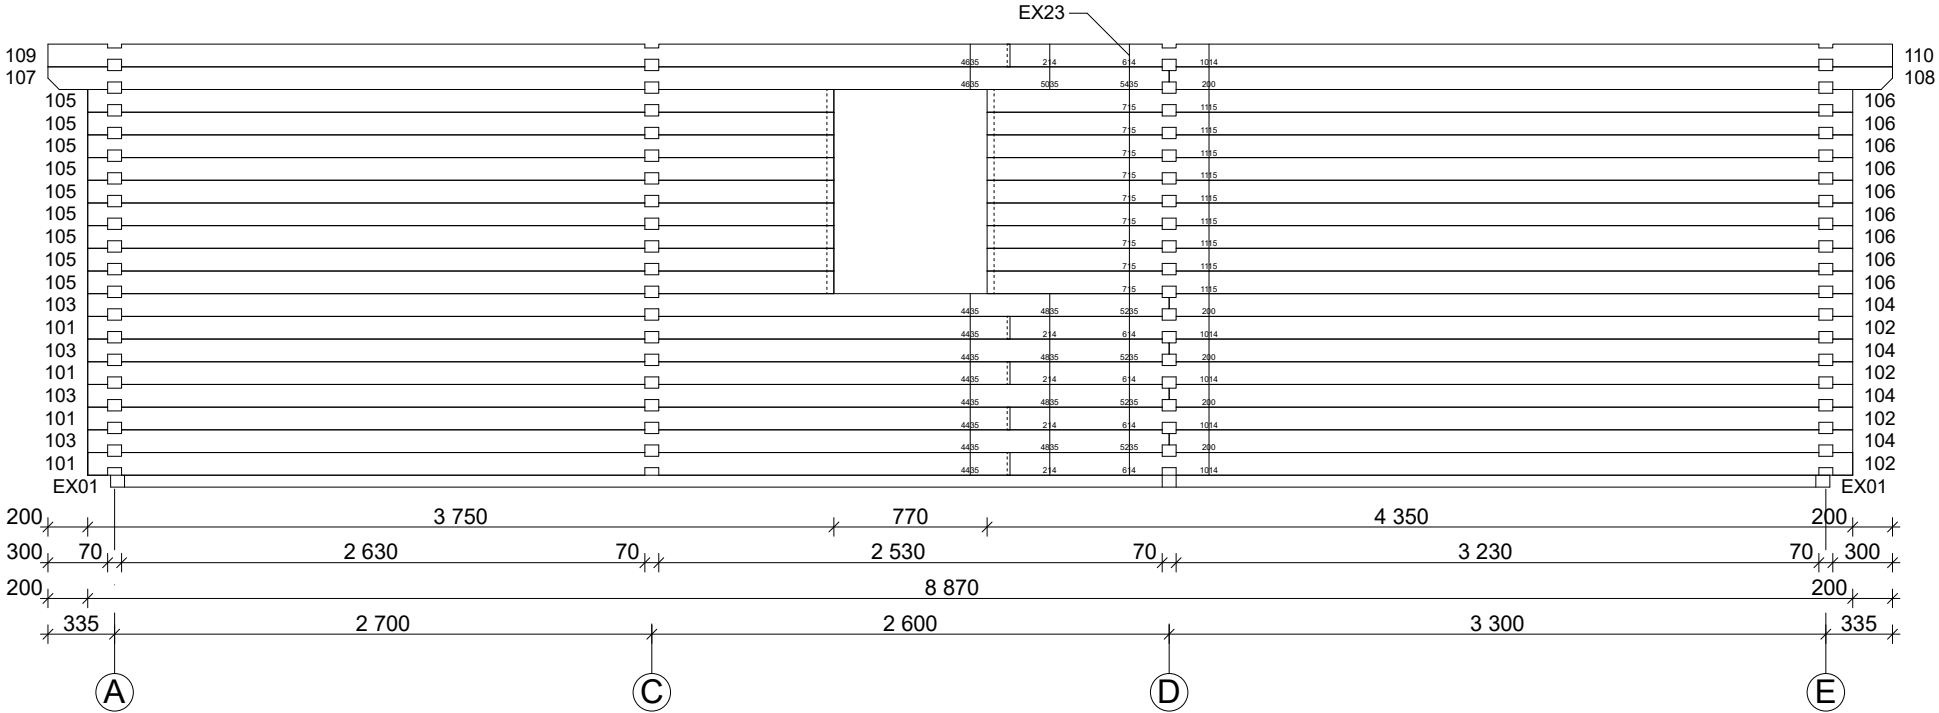


Alma 2 / 595 x 887 cm

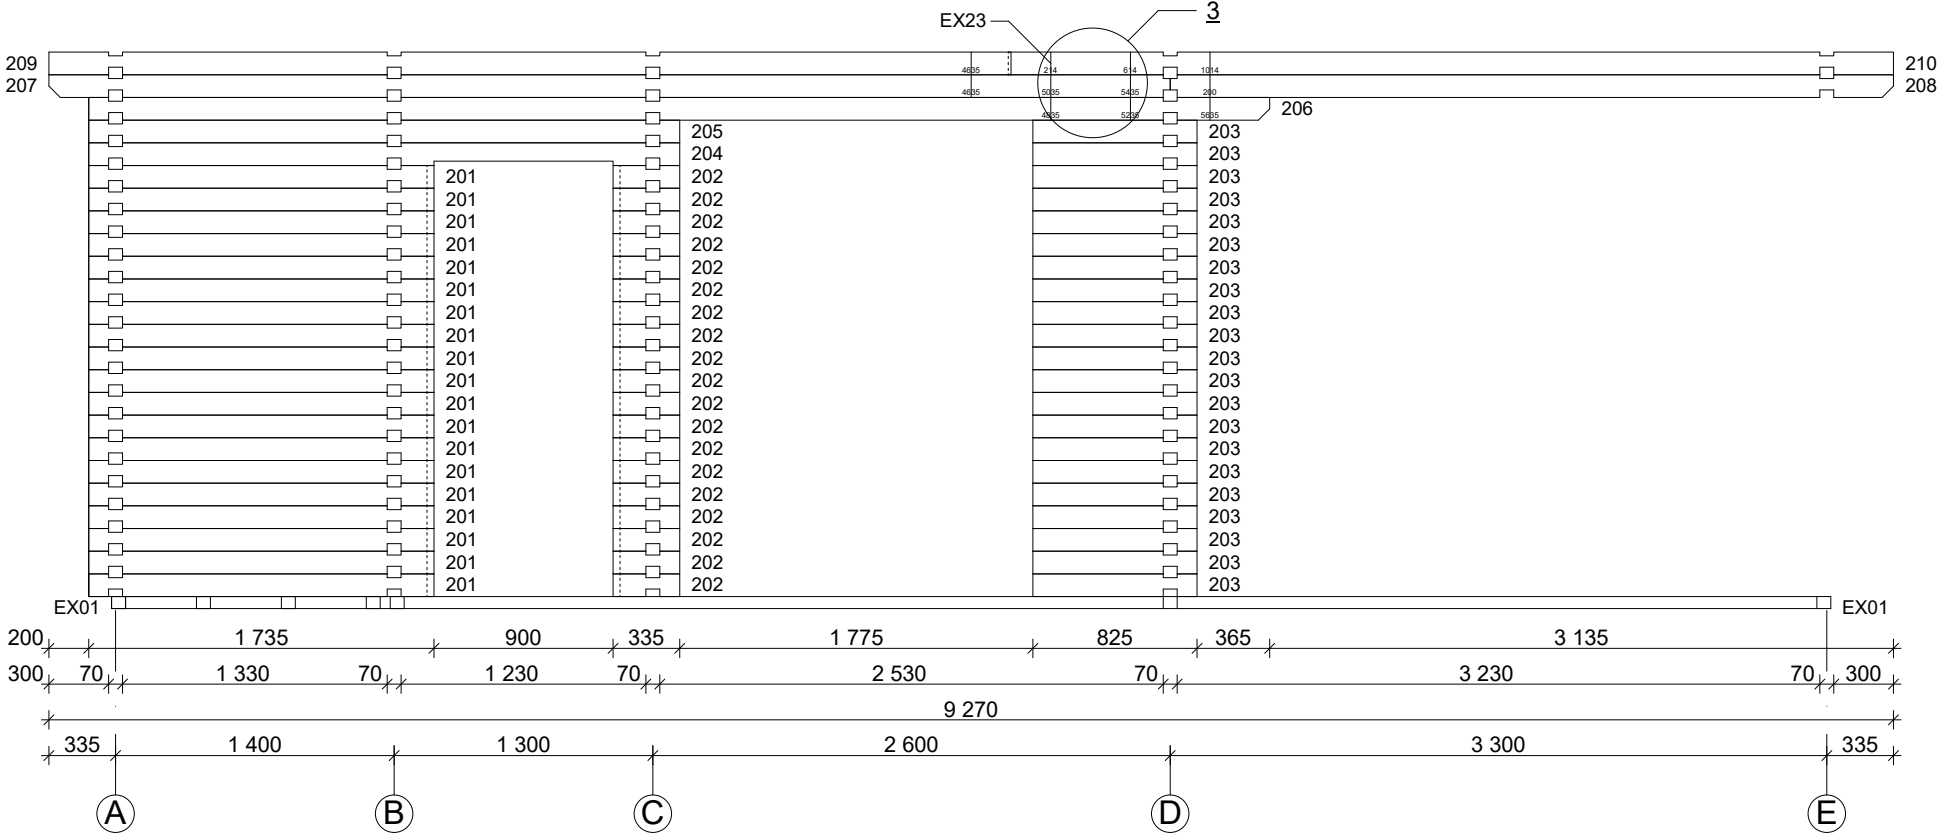



Alma 2 / 595 x 887 cm

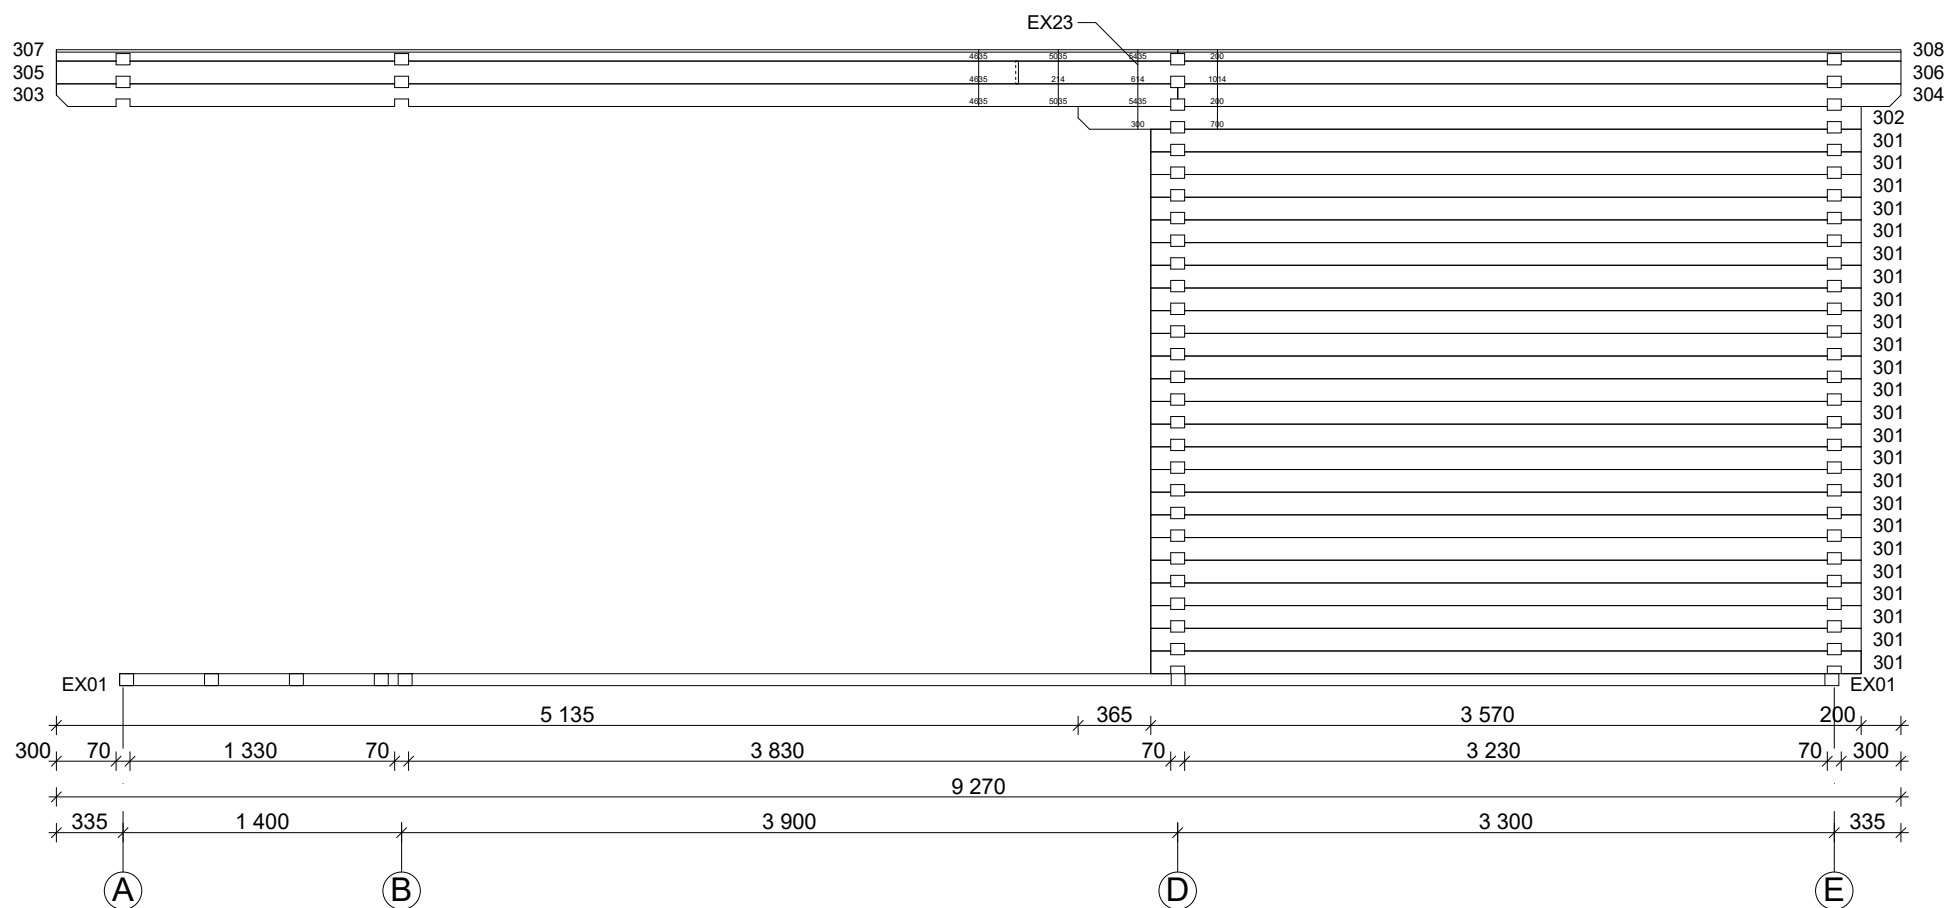









Alma 2 / 595 x 887 cm









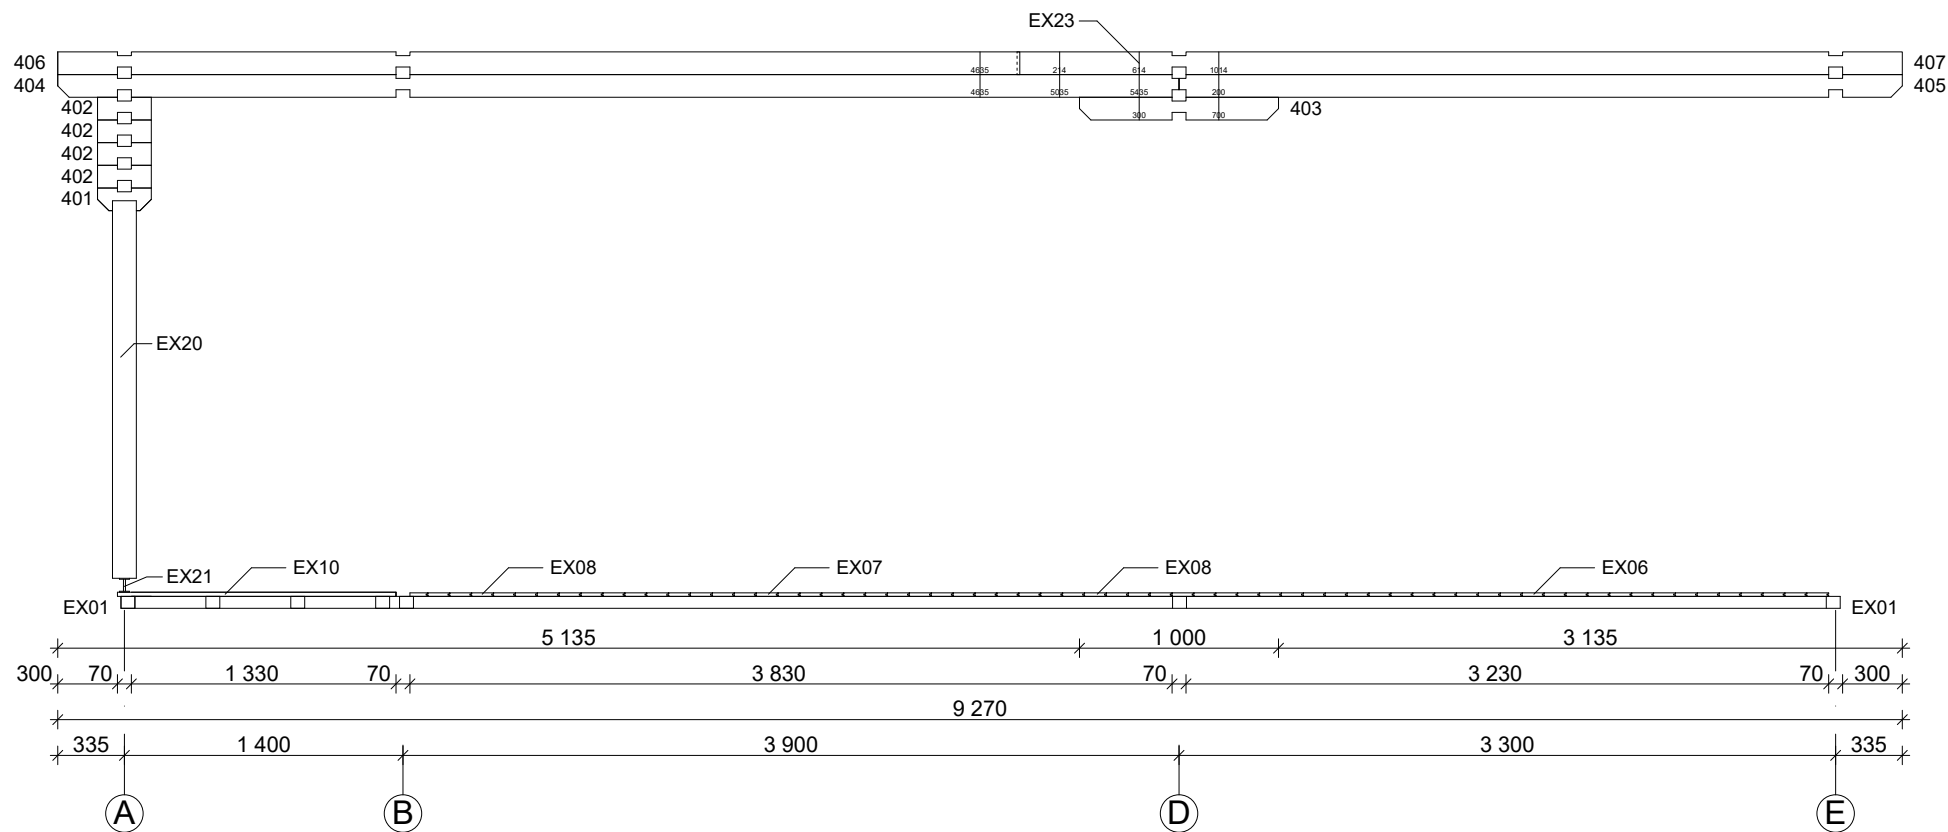








Alma 2 / 595 x 887 cm

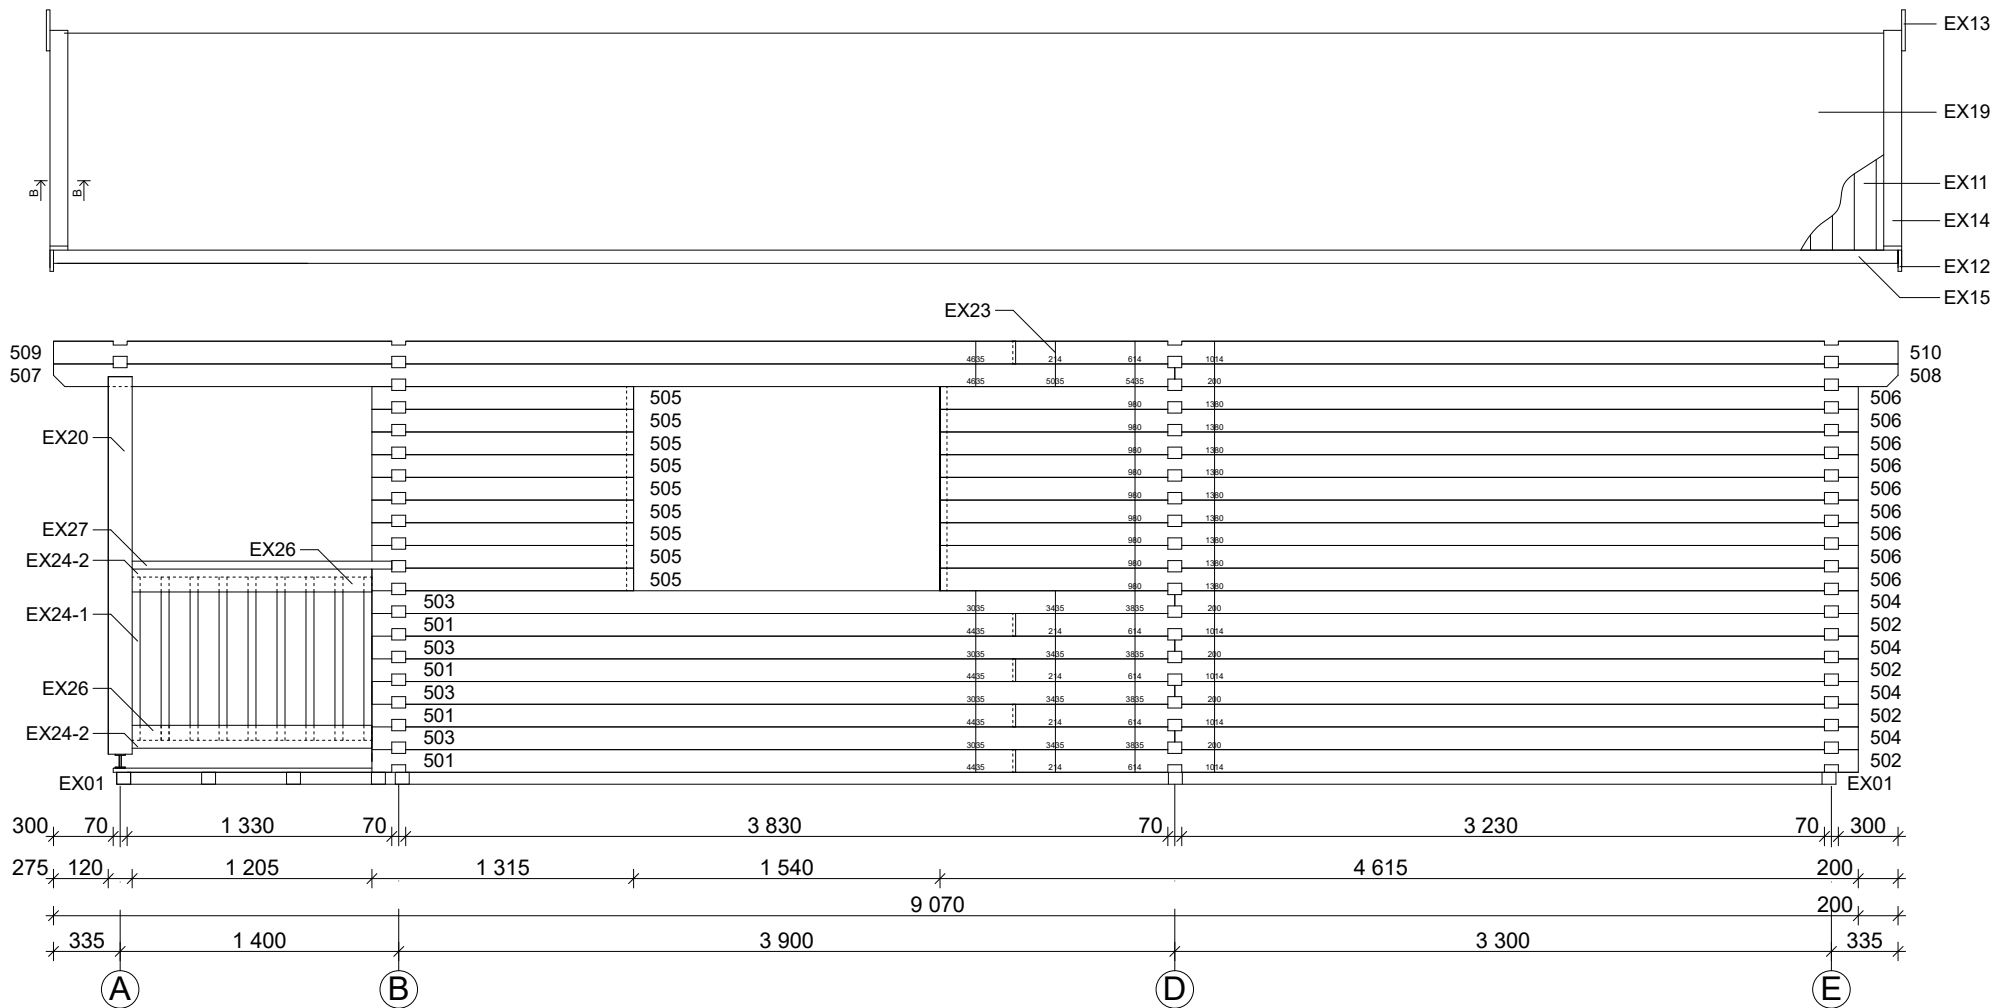















Alma 2 / 595 x 797 cm - A; B; C











Nr.		 mm	 mm	 x
A01			1956	1
A02			1956	7
A03			675	20
A04			5950	1
A05			5950	1
A06			5395	1
A07			4721	1
A08			4046	1
A09			3372	1
A10			2698	1
A11			2023	1
A12			1349	1
A13			674	1

B01			839	1
B02			2525	1
B03			839	27
B04			2525	9
B05			916	9
B06			4264	1
B07			3987	1
B08			3649	1
B09			3312	1
B10			2975	1
B11			2638	1
B12			2023	1
B13			1349	1
B14			674	1

C01			1956	1
C02			1956	18
C03			1956	1
C04			1679	1
C05			1341	1
C06			1004	1
C07			667	1
C08			330	1




Alma 2 / 595 x 797 cm - D; E



Nr.				
D01			1948	1
D02			633	1
D03			1569	1
D04			1948	17
D05			633	18
D06			1569	17
D07			1948	1
D08			1569	1
D09			5950	1
D10			5395	1
D11			4721	1
D12			4046	1
D13			3372	1
D14			2698	1
D15			2023	1
D16			1349	1
D17			674	1

E01			5950	1
E02			5950	9
E03			1170	18
E04			2070	9
E05			5950	1
E06			5395	1
E07			4721	1
E08			4046	1
E09			3372	1
E10			2698	1
E11			2023	1
E12			1349	1
E13			674	1

Alma 2 / 595 x 797 cm - 1; 2; 3


Nr.			 mm	 mm	 x
101		Female fishtail		4635	4
102		Male fishtail		4235+14	4
103				5435	4
104				3435	4
105				3750	9
106				4350	9
107				5635	1
108				3635	1
109		Female fishtail		4835	1(1+0)
110		Male fishtail		4435+14	1(1+0)



201				1735	19
202				335	19
203				825	21
204				2970	1
205				2970	1
206				5935	1
207				5635	1
208				3635	1
209		Female fishtail		4835	1(1+0)
210		Male fishtail		4435+14	1(1+0)


301				3570	24
302				3935	1
303				5635	1
304				3635	1
305		Female fishtail		4835	1
306		Male fishtail		4435+14	1
307				5635	1
308				3635	1

Alma 2 / 595 x 797 cm - 4; 5; DB













Nr.				
401			270	1
402			270	4
403			1000	1
404			5635	1
405			3635	1
406			4835	1(0+1)
407			4435+14	1(0+1)
406			Female fishtail	
407			Male fishtail	

501		Female fishtail	3235	4
502		Male fishtail	4235+14	4
503			4035	4
504			3435	4
505			1315	9
506			4615	9
507			5635	1
508			3635	1
509		Female fishtail	4835	1(0+1)
510		Male fishtail	4435+14	1(0+1)





DB01			5635	2
DB02			3635	6
DB03			5635	4
DB04			1000	6
DB05		Female fishtail	4835	2(2+0)
DB06		Male fishtail	4435+14	6(3+3)
DB07		Female fishtail	4835	4(1+3)

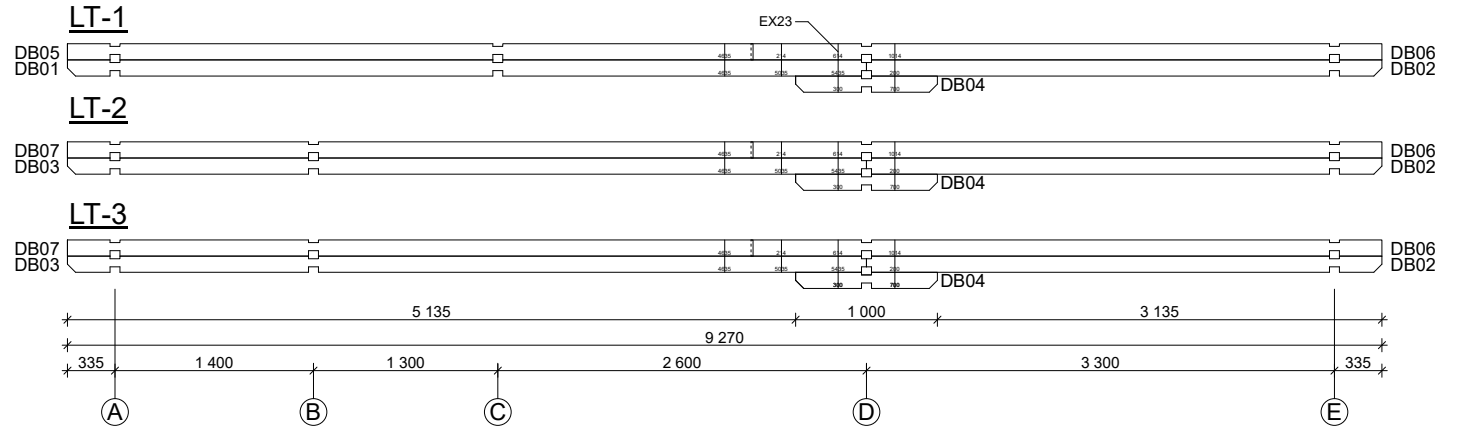


Alma 2 / 595 x 887 cm - EX (1/2)

Nr.		 mm	 mm	 x
EX01	Foundation beams / Fundamenthölzer		5720	3
EX02			5215	5
EX03			3924	4
EX04			3815	7
EX05			3215	12
EX06	Floor boards / Fußbodenbretter		2767	60
EX07			5607	26+1
EX08			3920	10
EX09			1613	22
EX10	Terrace board / Terrassendielen		1400	41+1
EX11	Roof boards / Dachbretter		3350	170+2
EX12	Fascia board / Giebelblende 		3400	4
EX13	Diamond / Raute			2
EX14	Gable edge board / Giebelabschlussbrett		3400	4
EX15	Eave edging / Traufenbrett		4635	4
EX16	Eave edging slat / Traufenleiste		3090	6
EX17	Hitblock / Schlaghölzer 		300-400	1-3
EX18	Baseboard / Fußleisten		ca. 51,0 m	
EX19	Roofing felt / Dachpappe			--
EX20	Post / Pfoste 		1900	2
EX21	Adjustable postfoot / Stütze			2
EX22	Threaded Rod / Gewindestangen	Ø 10	2200	7
EX23	Dowel / Dübel	Ø 16	150	120
EX24-1	Baluster 		820	21
EX24-2			1205	2
EX24-3			1566	2
EX25-1	Handrail / Terrassenabschußbrett 		1566	4
EX25-2			1566	1
EX26			1205	4
EX27			1305	1
EX28			4,0 x 40	270
EX29			4,0 x 50	2550
EX30			5,0 x 70	80
EX31			6,0 x 140	100
EX32			1,4 x 35	150
EX33				14


Alma 2/ 595 x 887 cm - EX (2/2)

Nr.		 mm	 mm	 x
EX34	Door / Einzeltür 890 x 2090 mm - L Premium Double Glazed ISO / Verglasung Lämpölasit Isolerglas (3+6+3 70mm)			1
EX35-1	Door / Einzeltür 890 x 2090 mm - L (70mm)			2
EX35-2	Door / Einzeltür 890 x 2090 mm - R (70mm)			1
EX36	Window / Einzelfenster 765 x 990 mm - Tilt & Turn / Dreh Kipp - R Premium Double Glazed ISO / Verglasung Lämpölasit Isolerglas (4+16+4 70mm)			4
EX37	Window / Einzelfenster 600 x 1100 mm - Tilt & Turn / Dreh Kipp - R Premium Double Glazed ISO / Verglasung Lämpölasit Isolerglas (4+16+4 70mm)			1
EX38	Double window / Doppelfenster 1530 x 990 mm - Tilt & Turn / Dreh Kipp Premium Double Glazed ISO / Verglasung Lämpölasit Isolerglas (4+16+4 70mm)			1


A-A




1




3




B-B




2




4



4

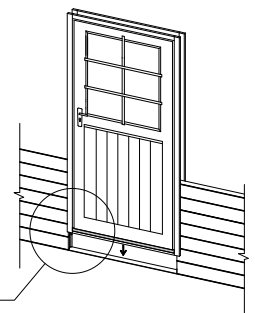


1

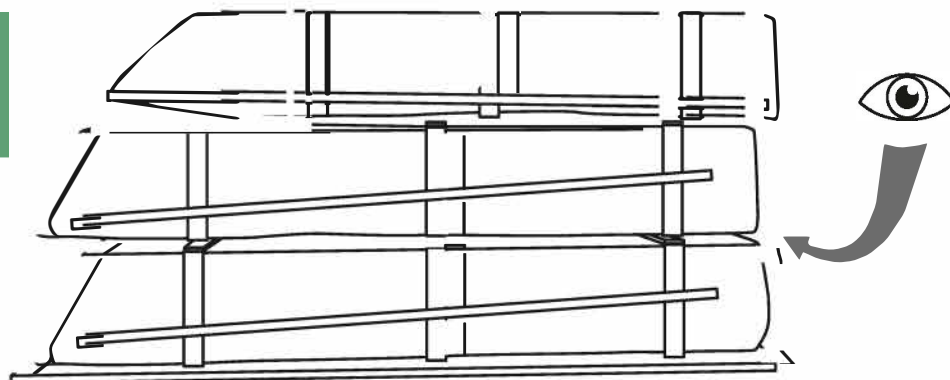

- EE** Sõltuvalt tellitud mudelist asuvad immutatud vundamendiprussid ja terrassilaudad TENE pakkimiskile all.
- ENG** Depending on the model ordered it may include impregnated foundation beams and terrace boards, these are packed at the bottom of the package.
- DE** Je nach bestelltem Modell sind die imprägnierte Fundamentbalken und Terrassenbretter unter TENE-Verpackungsfolie zu finden.
- ES** Según modelo, los rastreles del suelo y las tablas de la terraza tratadas en autoclave verde, se sitúan en la parte inferior del paquete, debajo de plástico de embalaje con logotipo Tene.
- IT** In base al modello ordinato, le travi impregnate da pavimento e i pannelli di rivestimento si trovano sotto la pellicola d'imballaggio TENE.
- FR** Selon le modèle dans votre commande, les poutres de fondement imprégnées et les lames de terrasse se trouvent sous le film de conditionnement TENE.
- PL** W zależności od zamówionego modelu impregnowane belki fundamentowe i deski tarasowe są umieszczone pod foliowym opakowaniem TENE.
- FI** Kyllästetyt pohjapalkit ja terassilaudat sijaitsevat tilauksesta riippuen TENE-pakkauskalvon alla.
- SE** Beroende på beställd modell förpackas impregnerade syldelar och terrassbrädor i TENEs emballageplast.
- DA** Afhængigt af hvilken model, der er bestilt, befinder de trykimprægnerede fundamentsstrøer og terrassebrædder sig under TENE's emballageplast.
- RU** В зависимости от заказанной модели пропитанный фундаментный брус и террасная доска TENE находятся под упаковочной пленкой.

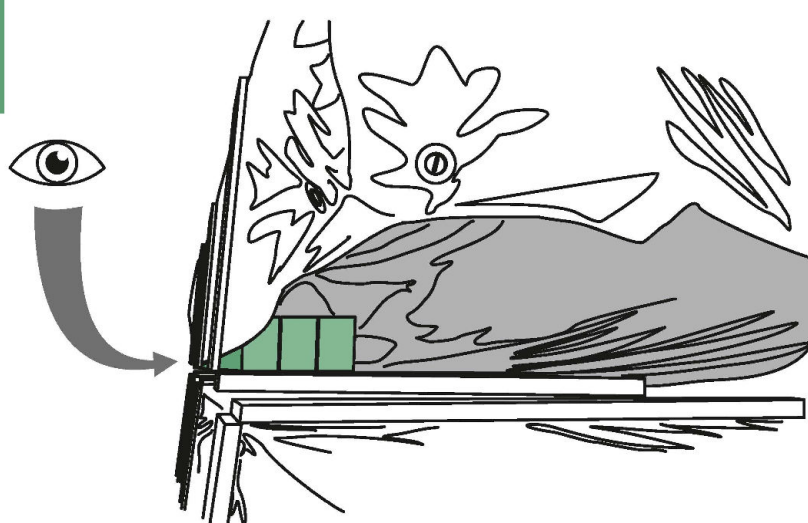2



- EE** Vaata pakkimiskile alla, et leida puuduolevad maja osad!
- ENG** Please look at the bottom of the packaging to find these house parts.
- DE** Schauen Sie bitte unter Verpackungsfolie nach, um die fehlenden Teile herauszufinden!
- ES** Mira por debajo del plástico con logotipo de Tene, encontrarás las piezas que te faltan. Las reconocerás por su tono verdoso.
- IT** Controlla sotto la pellicola d'imballaggio per trovare le altre parti della casa!
- FR** Regarde sous le film de conditionnement pour trouver les détails manquants de la maison!
- PL** Zajrzyj pod foliowe opakowanie, aby znaleźć brakujące elementy domu!
- FI** Puuttuvat talon osat löytyvät pakkauskalvon alta!
- SE** Titta under emballageplasten för att hitta saknade husdelar!
- DA** Se under emballageplasten for at finde manglende dele til huset.
- RU** Посмотрите под упаковочную пленку, чтобы найти недостающие части дома!

